



# Smile

OPEN SOURCE SOLUTIONS

COMITÉ DE PILOTAGE DU 26 AVRIL 2017

CGN 

#LAKEXCEPTION

## CGN – Refonte e-commerce

open  
source

# SOMMAIRE

1. Information équipe projet
2. Avancement
3. Planning
4. Axes de vigilance
5. Point facturation
6. Critères de satisfaction
7. Prochaines réunions


A photograph of dandelion seeds floating in the air against a clear blue sky. In the bottom left corner, a large, close-up dandelion seed head is visible, showing its green and brown structure. The rest of the image is filled with numerous smaller dandelion seeds, each with its characteristic white, feathery pappus, scattered across the sky.

# INFORMATION EQUIPE PROJÉT

3

# L'ÉQUIPE PROJET

# PARTENAIRES

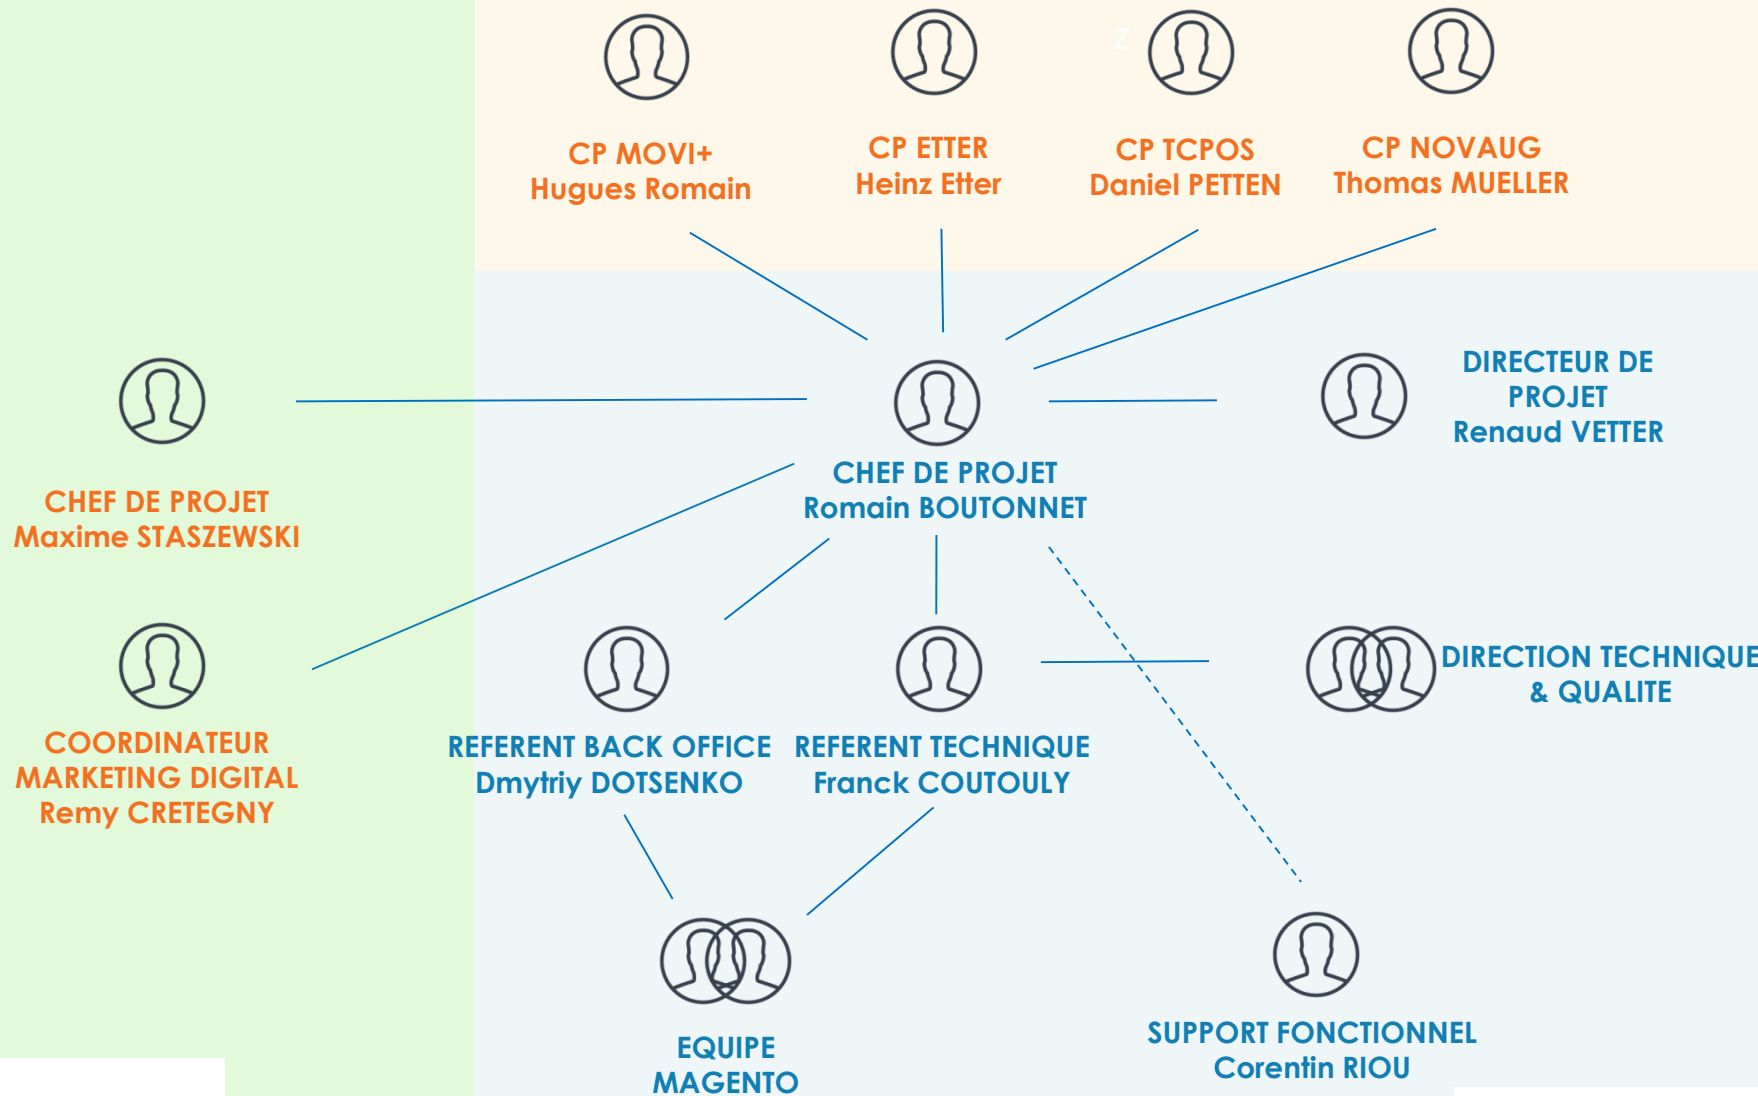

# CHANGEMENT DE CHEF DE PROJET

## I Bascule de chef de projet

- **Départ de Corentin RIOU sur une autre mission**
- **Arrivée de Romain BOUTONNET**
  - Présent lors de la phase de conception générale
  - Présent lors de la phase d'ergonomie / design

## I Continuité dans l'équipe

- **Franck COUTOULY : Chef de projet technique**
  - Présent depuis la phase de conception générale
- **Dmytriy DOZENKO : Chef de projet back office**
  - Présent depuis le début de la phase de développement
- **Corentin RIOU : Présence possible (en attente de confirmation)**
  - Sur les comités projets
  - Sur les points de suivi avec Movi+

A photograph of dandelion seeds floating in the air against a clear blue sky. In the bottom left corner, a large, close-up dandelion seed head is visible, showing its brown, spiky structure and green center. The rest of the image is filled with numerous smaller dandelion seeds, each with its characteristic white, feathery pappus, scattered across the sky.

# AVANCEMENT

## FAITS MARQUANTS SUR LA PÉRIODE PASSÉE

### | Avancement Movi+

- **Maintien des points de suivi hebdomadaire**
- **Moteur de recherche horaire en cours de finalisation**
- **Ajustements encore à mettre en place :**
  - Masquage des stations non disponibles (WS en mode mock up)
  - Gestion des contingents pour les produits packagés
  - Gestion de la réservation : appel WS mis en place mais à tester dans le cadre d'un flux complet






### | Hosting

- **Mise en place de l'environnement de production en cours (70 %)**
- **Souci sur la configuration non alignée entre production et autres environnements (NGINX)**

### | TC POS

- **Bascule sur une génération du QR Code directement dans Magento**

## SITUATION SUR INTÉGRATION PARTENAIRE

Partenaire	Indicateur	Commentaires
Movi +		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Meilleure visibilité suite à la mise au point de synchronisation</li> <li>- Difficulté à tenir les dates de livraison de la part de Movi+</li> <li>- Peu rassurant sur la maîtrise des livraisons</li> </ul>
Etter		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ API intégrée</li> <li>+ Tests en cours</li> <li>o Vérification de l'installation du serveur de production</li> </ul>
TCPOS		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Intégration directe dans Magento (indépendance vis-à-vis de TCPOS)</li> <li>- Compréhension de l'outil de test TCPOS</li> <li>o Estimation de la phase de test du QR Code TCPOS</li> </ul>
NOVAUG		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Intégration effectuée d'un point de vue Smile</li> <li>- Souci avec le WS NOVAUG qui répond une erreur</li> <li>o Envoi des QR Code de test à NOVAUG pour validation de l'implémentation</li> </ul>
Saferpay		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Module de paiement installé</li> <li>+ Validation de la configuration production / préproduction</li> <li>- Tests en cours. Éléments manquants pour finir la configuration</li> </ul>



# AVANCEMENT

## RÉALISATIONS

### | Movi+

- Finalisation de la partie recherche horaire en cours (derniers ajustements en cours)

### | Etter

- Implémentation terminée

### | NOVAUG

- Implémentation à 90%
- En attente de correction des WS

### | TC POS

- Implémentation en cours

### | Avancement

- Catalogue : 70%
- Pages annexes : 80%
- Tunnel de vente : 40%
- Espace client : 20%



# PLANNING

# PLANNING

Mai 2017

Juin 2017

Développements

Recette interne Smile

Recette finale CGN

★  
22/06 : Mise  
en ligne

## GO Live

- Décalage de la mise en ligne du 12/06 au 22/06 par la prise en compte des évolutions :
  - Gestion des cartes journalières
  - Gestion d'un niveau de configuration supplémentaire pour les produits packagés

# PLANNING

## I PREPRODUCTION

- Contribution de la partie catalogue : En cours
- Début de la contribution des pages annexes : 02/05/2017
- Traduction de l'ensemble des libellés : En cours

## I PRODUCTION

- Switch préproduction -> production à planifier dès validation de l'environnement de production
  - Contenu
  - En 1 fois




A photograph of dandelion seeds blowing away from a seed head in the bottom left corner against a clear blue sky. The seeds are captured in mid-air, creating a sense of movement. The text 'AXES DE VIGILANCE' is overlaid on the image in white letters on orange rectangular backgrounds.

AXES

DE VIGILANCE

13

# AXES DE VIGILANCE

Risque identifié	Proba	impact.	Tendance	Actions à mettre en place
<b>Retard Movi+</b>	70%	5/5		<b>SMILE / CGN</b> : Maintien des points hebdomadaires avec Movi+ pour suivi des actions
<b>Difficulté de la partie test TCPOS</b>	50%	5/5		<b>SMILE / CGN</b> : faire un point téléphonique pour finir de clarifier cette phase de test
<b>Difficulté suite au changement de chef de projet</b>	100%	3/5		<b>SMILE</b> : Maintien de la présence de l'ancien chef de projet pendant le mois de Mai pour faciliter la transition

A photograph of a dandelion seed head in the bottom left corner, with many seeds blowing away into the air against a clear blue sky. The seeds are captured in mid-air, creating a sense of movement and dispersal.

# ACTIONS ET DÉCISIONS

15

# ACTIONS ET DÉCISIONS

A/D/I	Redmine	Action / décision	Resp.	Pour le	Statut
A	#587155	Envoi du premier lot de traductions	Smile	27.04.2017	En cours
A	#584990	Mise à jour de la spécification catalogue / tunnel de vente	Smile	27.04.2017	En cours
A	#584988	Récupérer le programme de test TCPOS	Smile / CGN		En cours
A	#567983	Environnement de production Saferpay	Smile	03.05.2017	En cours
A	#586216	Mise en place d'un fichier de cas de test pour la recherche horaire	Movi+	02.05.2017	En cours
A	#582950	Choix concernant les pictos manquants dans le résultat de recherche de trajet	Smile		Clos
A	#584987	Facturation des évolutions validées	CGN	03.05.2017	En cours
A	#587815	Envoi de billets de test à NOVAUG	Smile	02.05.2017	Nouveau
I		Remplacement de Corentin RIOU par Romain BOUTONNET			
A	#588028	Demander Net4All de basculer sur la configuration Nginx / Apache	CGN	03.05.2017	Nouveau
A	#588092	Mise en place de la configuration GTM	CGN	03.05.2017	Nouveau
A	#588093	Mise en contact avec un consultant GTM	Smile	08.05.2017	Nouveau
A	#588105	Définition des redirections 301	CGN	05.06.2017	Nouveau





POINT

FACTURATION

17

CGN

**Smile**  
OPEN SOURCE SOLUTIONS

# SUIVI FACTURATION

N° de facture	Jalon	Date paiement	Montant CHF
<b>2016 / 100012</b>	Maintenance évolutive	22/06/17	<b>19 440,00</b>
<b>2016 / 100020</b>	Fin de la garantie (HTML)	22/09/17	<b>2 486,43</b>
<b>2016 / 100030</b>	Fin de la garantie (Intégration)	22/09/17	<b>6 323,13</b>
<b>2016 / 100037</b>	Maintenance corrective A1	22/06/17	<b>21 075,12</b>
<b>2016 / 100038</b>	Maintenance corrective A2	A rediscuter	<b>14 049,72</b>
<b>2016 / 100039</b>	Maintenance corrective A3	A rediscuter	<b>7 025,40</b>
<b>2017 / 010057</b> <b>2017 / 010058</b>	Guerilla testing	Payée	<b>12 736,00</b>
	Premier lot d'évolutions	En attente BdC signé	<b>17 812,50</b>

A photograph of dandelion seeds blowing away from a seed head in the bottom left corner against a clear blue sky. The seeds are captured in mid-air, creating a sense of movement. The text 'CRITÈRES DE SATISFACTION' is overlaid on the right side of the image in white capital letters on an orange background.

# CRITÈRES DE SATISFACTION

# QUALITÉ

## & CRITÈRES DE SATISFACTION

5 : *Tout à fait satisfait*

4 : *Satisfait*

3 : *Moyennement satisfait*

2 : *Peu satisfait*

1 : *Mécontent*

Critères	Evaluation	
Qualité des livrables (présentation, format, lisibilité, contenu, ...)	4.5/5	
Visibilité sur le projet	4.5/5	
Disponibilité de Smile	4.5/5	
Réactivité de Smile	5/5	
Accompagnement de Smile	4.5/5	

A photograph of dandelion seeds floating in the air against a clear blue sky. In the bottom left corner, a large, close-up dandelion seed head is visible, showing its brown, spiky structure and green center. The seeds are scattered across the frame, some with their long, feathery parachutes fully extended, others just beginning to rise.

# PROCHAINES RÉUNIONS

# PROCHAINES RÉUNIONS

- | Prochain comité projet : 05/05 à 14h00
- | Proposition pour prochain COPIL CGN/ SMILE : ???
- | Prochain point Movi+ : ???

MERCI !
